

# INWESTYCJE
# GMINA MIĘDZYCHÓD
# 2026



**stopień realizacji przyjętych zadań inwestycyjnych**

**zamierzenia na kolejne miesiące**



# Stopień realizacji przyjętych zadań inwestycyjnych

## INWESTYCJE ZAKOŃCZONE


# Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 229578P – ul. Strzelecka w Międzychodzie wraz z przebudową odcinków dróg gminnych do niej przyległych - etap I


**Wartość robót: 7.201.701,12 zł**

**Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 3 121 578,8 zł**

Wykonawca robót: RENOMEX Sp. z o.o.
ul. Młynkowska 1c, 64-550 Duszniki,

I etap inwestycji został ukończony
19 czerwca 2026 r. i odebrany 16 lipca 2026 r.

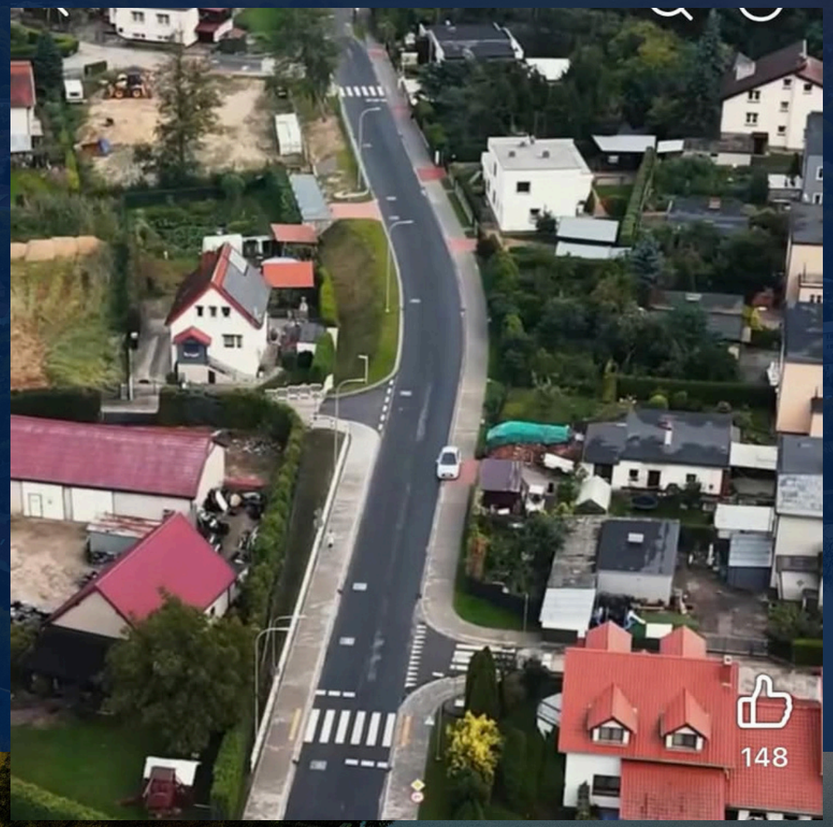
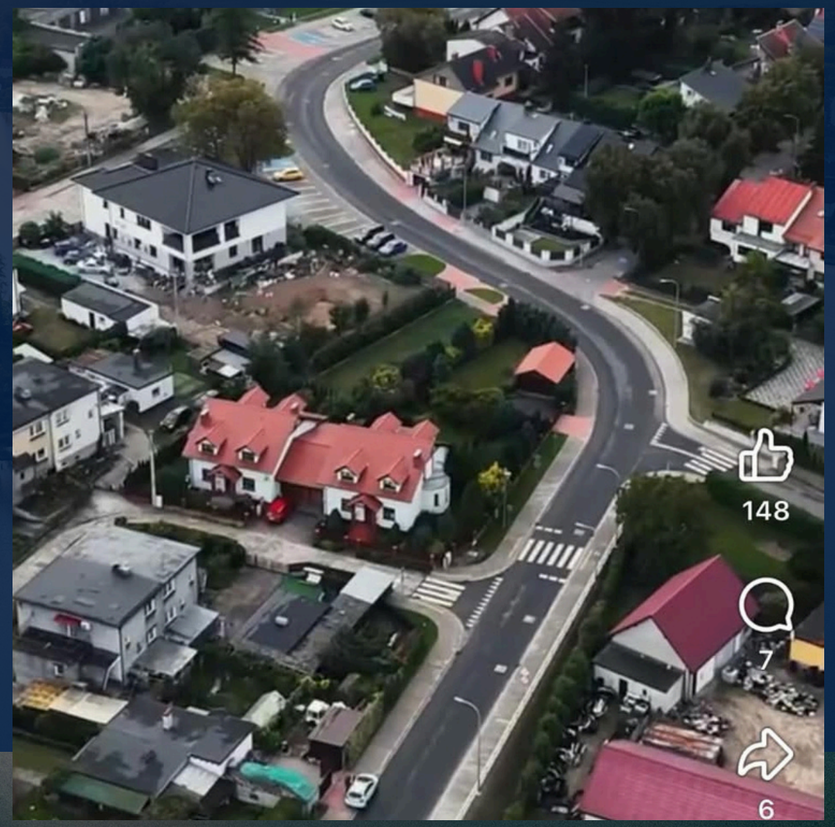
# Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gralewo

**Wartość robót: 472.519,86 zł**

**Dofinansowanie: 61.200,00 zł (Drogi dojazdowe do pól - Urząd Marszałkowski)**

Wykonawca: RENOMEX Sp. z o.o.
której siedziba mieści się w Dusznikach

Inwestycja odebrana 2.09.2026 r.





# Naprawa nawierzchni części Rynku w Międzychodzie

**Wartość robót: 77.582,25 zł**

Wykonawca: Firma Drogowa
Magdalena Górna-Racka

Prace wykonane w ramach umowy bieżącej
na naprawy nawierzchni bitumicznych





# Modernizacja Remizy OSP w Radgoszczy

## Prace wykończeniowe pomieszczenia poddasza na świetlicy MDP

**Wartość robót: 63.080,11 zł**

Wykonawca: Usługi Ogólnobudowlane Grzegorz Osuch,
ul. Polan 9, Bielsko, 64-400 Międzychód

Zadanie zrealizowane do 13 lipca 2026 r.





# Remont drogi Kolno - Popowo

**Wartość robót: 94.425,87 zł**





# Zakup wiat przystankowych

**W połowie marca zamontowano wiatę przystankową w m. Dormowo, na początku kwietnia zostały zamontowane trzy wiaty przystankowe – dwie przy ul. Plac Kościuszki i jedna w Gralewie**

Dormowo:
Wykonawca: MM 2021 Sp. z o.o.,
ul. Przemysłowa 1a, 63-720 Koźmin Wielkopolski
Wartość robót: 13.231,31 zł




Gralewo oraz Międzychód – Plac Kościuszki:
Wykonawca: Wamet Artur Masztalerz, Dariusz Nowak, Łukasz Jagielski Spółka Jawna, Rydzyna
Wartość robót: 37.009,47 zł



# Przepust nad Jeziorem Miejskim w Międzychodzie

**Wartość robót: : 11.685,00 zł**

Usługi Transportowe Samochodem
Ciężarowym Dariusz Grześkowiak





# W ramach zawartego porozumienia wymieniono oprawy sodowe na oprawy LED (100 szt.) na słupach będących własnością Enea Oświetlenie

**ulice: Wielowieś wzdłuż DW160, Ogrodowa, Bagienna, Zielona, Pohla, Konopnickiej, Powstańców Wielkopolskich, Usługowa, Pocztowa**



# Stopień realizacji przyjętych zadań inwestycyjnych

# INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI

# Budowa drogi gminnej ul. Na Ostrawy w Międzychodzie

**Wartość robót: 1.762.604,16 zł**

Wykonawca robót: RENOMEX Sp. z o.o.
ul. Młynkowska 1c, 64-550 Duszniki,

Inwestycja rozpoczęta, trwa budowa kanalizacji deszczowej i zabezpieczanie sieci energetycznej i telekomunikacyjnej. Termin zakończenia: 9 grudnia 2026 r.





# Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 229578P – ul. Strzelecka w Międzychodzie wraz z przebudową odcinków dróg gminnych do niej przyległych III etap

**Wartość robót: 7.201.701,12 zł**

Wykonawca: Graeb Sp. z o.o.,
ul. Strzelecka 18, 62-045 Pniewy

III etap inwestycji został przekazany wykonawcy do realizacji 10 września 2026r., trwa wycinka drzew mająca umożliwić dalsze roboty, przewidziany termin zakończenia do 9 października 2027r.







# Budowa drogi gminnej w Międzychodzie łączącej drogi wojewódzkie nr 160 i nr 182 pełniącej funkcję obwodnicy, wraz z infrastrukturą towarzyszącą - II etap, podetap III ul. Polna

**Wartość robót: 2.423.298,92 zł**

Wykonawca robót: RENOMEX Sp. z o.o.
ul. Młynkowska 1c, 64-550 Duszniki,

Rozpoczęcie prac: listopad 2026 r.
Termin realizacji: 21 czerwca 2027 r.





# Remont ul. Morwowa w Kamionnie

## Wartość robót: 87.782,32 zł





# Przebudowa drogi powiatowej w Łowyniu

## Inwestycja powiatowa przy udziale dotacji gminy Międzychód

**Wartość robót: 6,4 mln zł**

**Wkład gminy Międzychód: 1,3 mln zł**





# Oświetlenie drogowe w Radgoszczy (6), ulic: Jaskółczej (4) i Wyspiańskiego (7) w Międzychodzie oraz ul. Szkolnej w Łowyniu (6)

Instalatorstwo i pomiary elektryczne Paweł Jenek, Dzięcielin 37H (Wyspiańskiego, Jaskółcza i Radgoszcz), **Koszt:** 106.722,88 zł



Zakład Usług Elektrycznych Patryk Szadkowski, ul. Św. Wojciecha 83b/1, 66-300 Międzyrzecz (ul. Szkolna w Łowyniu), Koszt: 45.018,00 zł



# Poprawa dostępności szkół podstawowych Gminy Międzychód dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi

**Wartość robót: 1.901.580,00 zł**

**Dofinansowanie ze środków unijnych 1 125 719 zł**

Wykonawca: INTERO SERWIS Sp. z o.o.,
Warszawa



Zadanie w trakcie realizacji – wykonano niemal wszystkie prace poza montażem wind w SP1 i SP2 (mają być dostarczone ok. 5 października, montaż każdej ok. 7 dni) w SP2 gotowe są łazienki i zatoczka autobusowa,
od 23-24.09, będą wykonywane prace przy elewacji SP2, w Zespołach Szkolno Przedszkolnych w Kamionnie i Łowyniu zaawansowanie prac jest na poziomie ok. 90 %


# Program OLiOC

Budowa miejsca ukrycia dla 25 osób na dziedzińcu Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie – koszt 1 160 000,00 zł

Zakup dwóch agregatów dla: Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie oraz na Halę Widowiskowo-Sportową w Międzychodzie. Koszt – 249 800,00 zł


# DOTACJE PROEKOLOGICZNE W GMINIE MIĘDZYCHÓD

**682 251,48 zł**
**119 wnioski**



**Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy budynkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.**

**150 000,00 zł**
**4 wnioski**



# Projekty

| Zadanie | Koszt | Etap realizacji |
| --- | --- | --- |
| Budowa drogi gminnej 229505P w m. Mierzyn, do drogi wojewódzkiej nr 160 | 218 940,00 | Opracowano koncepcje, trwają prace nad projektem budowlanym |
| Rozbudowa i przebudowa ul. Słonecznej i ul. Na Skarpie w Międzychodzie | 171 806,40 | Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin wykonania 20 czerwca 2027 r. Uzgodniono ostateczną wersję, gotowy do uzyskania decyzji administracyjnej |
| Przebudowa drogi gminnej ul. Plac Kościuszki wraz z przyległymi drogami | 156 825,00 | Umowa na opracowanie dok. Projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi oraz zagospodarowania terenów zieleni przy jeziorze miejskim w Międzychodzie została przedłużona aneksem do 30 września 2026r. Wykonawca: NANA Studio Architektury Ilona Najdek-Bajer |

| Zadanie | Koszt | Etap realizacji |
| --- | --- | --- |
| Opracowanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 160 | 150 060,00 | 10 lipca 2026r., do Wojewody Wielkopolskiego złożony został wniosek (wraz z dokumentacją) o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej |
| Budowa pasywnej świetlicy wiejskiej w Kolnie | 100 000,00 | 16.09 Podpisano umowę na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku świetlicy wiejskiej w technologii pasywnej (termin do 31.03.2027r.) |
| Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 229517P ul. Prusimska w m. Bielsko | 99 950,00 | Termin na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej został wydłużony do 30 listopada 2026 r., ze względu na konieczność zmiany procedury uzyskania zgody na realizację przedsięwzięcia – z pozwolenia na budowę na zezwolenie na realizację inwestycji drogowej –ZRID |

| Zadanie | Koszt | Etap realizacji |
| --- | --- | --- |
| Budowa drogi gminnej 229519P w m. Radgoszcz | 97 170,00 | Umowa aneksowana do 15 grudnia 2026r., z uwagi na brak wydania przez Zarząd Zlewni w Gorzowie Wlkp. decyzji wodnoprawnej na budowę ,trwa dopełnianie dodatkowych obowiązków nałożonych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, związanych z lokalizacją inwestycji na obszarze Natura 2000 – Puszcza Notecka. Wykonawca: System A Gniezno Antoni Przybylski, ul. Kawiary 25c/D/5, 62-200 Gniezno |
| Utwardzenie terenu przy BPiCAK – (dokumentacja) | 39 400,00 | Trwa opracowywanie projektów: sieci instalacji kanalizacji deszczowej, przebudowy i remontu istniejących sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej, utwardzenia trenu oraz wykonania ogrodzenia działki od strony ul. Iczka. |

| Zadanie | Koszt | Etap realizacji |
| --- | --- | --- |
| Pomosty nad jeziorem Miejskim w Międzychodzie | 32 000,00 | Gmina posiada dokumentację projektowo-kosztorysową pozyskaną w marcu 2026 r. (wraz z pozwoleniem na budowę), oraz pozwolenie wodno prawne<br>Wykonawca: Biuro Architektoniczne JEJ STUDIO – Aleksandra Kozłowska |
| Utwardzenie terenu przy Urzędzie Miasta i Gminy | 29 520,00 | Została wykonana dokumentacja na 2 części zadania: instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi i systemem czerpania wody deszczowej oraz utwardzenia nawierzchni wraz z budową miejsc postojowych, Jesteśmy w trakcie uzyskiwania pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie prac przy zabytku rejestrowym. |
| Szatnia na medal – rozbiórka istniejącego obiektu i budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy obiekcie sportowym w m. Mierzyn | 29 500,00 | Gmina posiada projekt budowlany wykonany przez Panią Marię Śliwa |

| Zadanie | Koszt | Etap realizacji |
| --- | --- | --- |
| Monitoring nad jeziorem miejskim (od boisk do siatkówki aż do DW160) | 17 712,00 | Gmina posiada dokumentację projektowo-kosztorysową przygotowaną przez Przedsiębiorstwo Usług Elektroenergetycznych ELEKTROGROM z siedzibą w Sierakowie |
| Oświetlenie ul. Wały Jana Kazimierza * (Wykonanie dok. projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Zaułek Rzeczny) | 13 189,00 | Gmina posiada dokumentację projektowo-kosztorysową opracowaną przez firmę HAJDASZ Jacek Hajdasz z siedzibą w Międzyrzeczu |
| Przebudowa ścieżki spacerowej przy jeziorze miejskim od ul. Czynu 600-lecia do plaży przy ul. Sokoła | 9 000,00 | Gmina posiada dokumentację projektowo-kosztorysową, Wykonawca: Biuro Architektoniczne JEJ STUDIO – Aleksandra Kozłowska Kolejny etap: zlecenie wykonania Projektu Technicznego |

| Zadanie | Koszt | Etap realizacji |
| --- | --- | --- |
| Oświetlenie Zatom Stary (wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci energetycznej NN 0,4 kV oświetlenia ulicznego miejscowości Zatom Stary w obrębie dz. 280) | 4 976,00 | Gmina posiada dokumentację projektowo-kosztorysową opracowaną przez firmę HAJDASZ Jacek Hajdasz z siedzibą w Międzyrzeczu |
| Łącznik ul. Czynu 600-lecia i 17 Stycznia | Nie dotyczy | W postępowaniu przetargowym nie została złożona żadna oferta. |

# Zamierzenia inwestycyjne na kolejne miesiące

Zakup wozu dla OSP Kamionna

Drogi tłuczniowe ok. 5-7 km

Ścieżki nad Jeziorem Miejskim

*termin realizacji zależny od uzyskania dotacji z LGD Puszcza Notecka

Pomosty nad Jeziorem Miejskim

*termin realizacji zależny od uzyskania dotacji z LGD Puszcza Notecka

Dokumentacja Białego Orła

Dokumentacja Rynku

Oświetlenie drogowe Zatom Stary, Wielowieś i Gorzyń (wykonanie)

Chodniki w Lewicach i Łowyniu

Doświetlenie przejść dla pieszych na Lipowcu

# Spółka AQUALIFT

11-lokalowy budynek komunalny przy ul. Wały Jana Kazimierza
3,3 mln zł
(wkład własny 20%, dotacja 80%)

Budowa dwóch automatycznych toalet na ulicy Mostowej oraz w strefie nadjeziornej. Projekt+realizacja

Remont ok. 10 mieszkań komunalnych
900 000,00 zł

Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w MSK Aqualift
440 000,00 zł
100% dotacji

Zagospodarowanie terenu sektora B1 na Cmentarzu Komunalnym w Międzychodzie
100 000,00 zł

Modernizacja SUW Gorzyń
1 700 000,00 zł

Modernizacja węzła osadowego na oczyszczalni ścieków przy ul. Muchocińskiej w Międzychodzie
700 000,00 zł

# Spółka MPEC

**Przygotowanie do realizacji**

Podpisanie umowy dotacyjnej NFOŚiGW w dniu 09.06.2026 r. na modernizacje 4 węzłów ciepłowniczych (Wyszyńskiego 6, Zamkowa 2 i Daszyńskiego 3 i 12) oraz magistrali ciepłowniczej (kwota dotacji 2 458 972,18 zł, 600 000,00 zł wkład własny)

Podpisanie w dniu 31.08.2026 r. umowy dotacyjnej z NFOŚiGW na budowę kotła biomasowego (1 MW) w Ciepłowni Rejonowej (dotacja 1 471 500,00 zł plus pożyczka preferencyjna 1 798 500,00)

**Zrealizowane, w trakcie odbioru**

Realizacja inwestycji “Modernizacja kotłów węglowych na olejowe w kotłowniach lokalnych Spółki MPEC” ( Łowyń - budynek gminny ul. Krótka 2, Przedlesie 2, Muchocin 13).
Koszt 710 000,00 zł brutto



# Dziękuję za uwagę

BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

**KRZYSZTOF SOBKOWSKI**
